
Cement Job Worksheet

DEMO-101 · Casing · Single slurry

9⅝″ casing · Hole 12¼″
TD 782 m · Shoe 778 m
10/20/2026

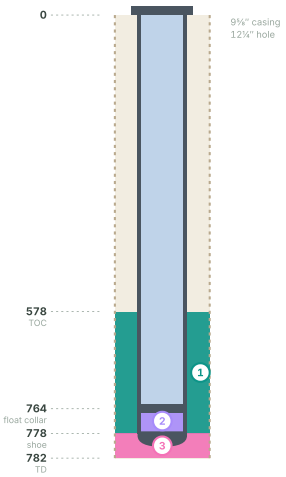

TOC	**578 m**
Float collar	**763.9 m**
Excess L OH/Cs	**0/0%**
Excess T OH/Cs	**35/0%**

Volume Calculations (B−T)×cap÷1000×(1+ex)

#	SECTION	WORKING	M³
1	Slurry · OH-Csg	(778−578)×29.10÷1000×1.35	**7.857**
2	Shoe track (9⅝″ intl)	(778−763.9)×39.55÷1000	**0.558**
3	Pocket / rat hole (12¼″ full)	(782−778)×76.04÷1000×1.35	**0.411**
	Slurry total		**8.825**
	TOTAL CEMENT		**8.83 m³**

Displacement to float collar

9⅝″ intl · 0→763.9	**30.21**
DISPLACEMENT · 2,218 stk @ 13.62 L/stk	**30.21 m³**

Slurry Design

Cement · 8.83 m³

Dry cement	8.83÷yield	**12.57 MT**
Mix fluid	12.57×conc	**4.80 m³**
Equiv dry	(4.80+0.00)÷conc	**12.57 MT**
CDF-1	12.57×2	**25.14 L**
CFL100	12.57×5	**62.86 kg**
CD200	12.57×4	**50.29 kg**
